



Klankbordgroep Windpark Waardpolder

5^e bijeenkomst

29 januari 2018

Dolf Geertzema






Agenda

- ❖ Opening, welkom
- ❖ Notulen 22 februari 2016
- ❖ Terugblik 2016 en 2017
- ❖ Windturbine selectie
- ❖ Bouwfase
- ❖ Obligatieregeling
- ❖ Stichting/vereniging
- ❖ Rondvraag
- ❖ Volgende datum sep/aug 2018
- ❖ Sluiting



Het windenergieproject

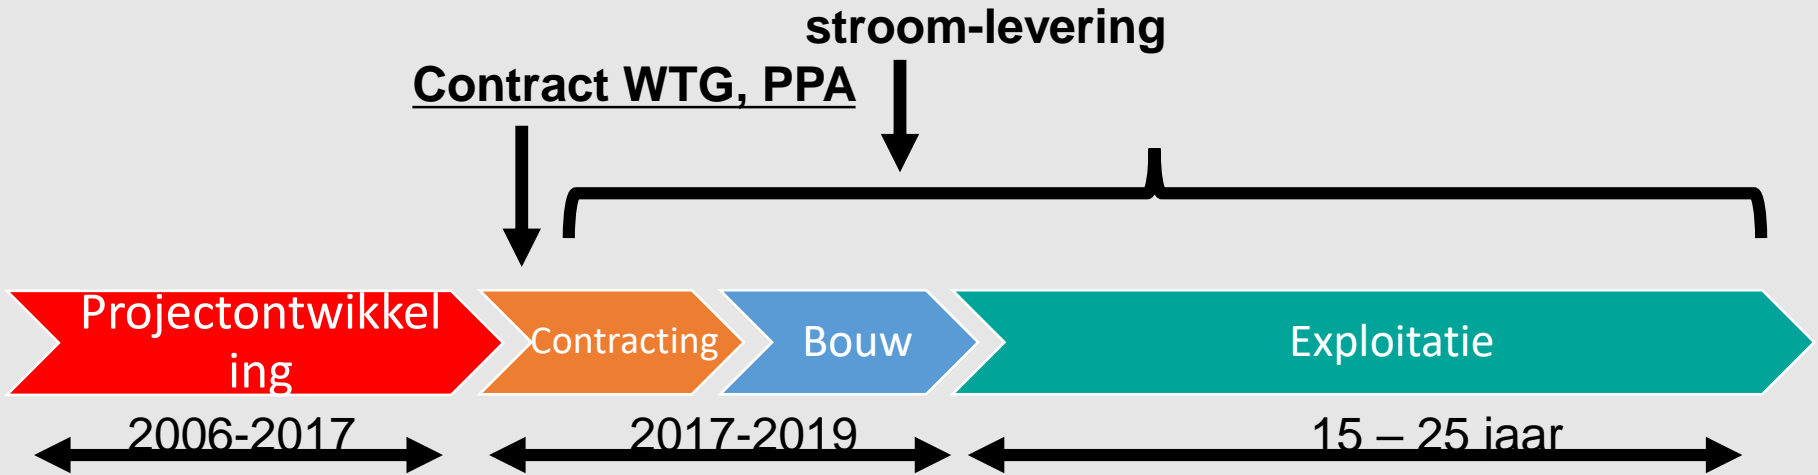



Terugblik 2016 en 2017

- ❖ Vanaf 15 januari 2016 tot en met 15 mei : definitieve aanvraag indienen omgevingsvergunning fase 1
- ❖ 17 aanvragen ingediend op 15 mei 2016
- ❖ Aanvullingen in mei/juni 2016 geweest
- ❖ In juni 2016: 6 aanvragen goedgekeurd en door naar de ARO
- ❖ 11 aanvragen voldoen niet aan de eisen en worden afgewezen
- ❖ Ranking door provincie, waardpolder 3
- ❖ Advies ARO augustus 2016 : ranking, ruimtelijke impact en ruimtelijke kwaliteitswinst
- ❖ Waardpolder eindigt als 2^e van de 6, maar alle 6 aanvragen mogen door, GS besluit 20 september
- ❖ Omgevingsvergunning aanvraag fase 2 ingediend november 2016



Terugblik 2016 en 2017

- ❖ Terinzagelegging voorlopige vergunning 23 februari tot 6 april 2017
- ❖ Informatieavond Igesz 21 maart 2017
- ❖ 12 zienswijzen ingediend : geluid, slagschaduw, impact , grootte, ruimtelijke inpassing e.a.
- ❖ Nota van antwoord 4 mei 2017
- ❖ Verklaring van geen bedenkingen, definitieve vergunning fase 1 en 2 en watervergunning commissie RWW 15 mei 2017 en PS 29 mei 2017
- ❖ Terinzagelegging definitieve vergunning 22 juni 2017
- ❖ Geen zienswijzen ingediend
- ❖ Onherroepelijke vergunning 2 augustus 2017



Na onherroepelijke vergunning

- ❖ SDE+ aanvraag oktober 2017
- ❖ Windturbine selectie
- ❖ Stroomcontract PPA
- ❖ Financiering



Windturbine selectie

- ❖ Long list gemaakt van 7 turbines: Vestas, Siemens, Gamesa, GE, Lagerweij, Nordex, Senvion
- ❖ Short list van 2: Nordex en Siemens Gamesa
- ❖ Belangrijkste eisen en criteria opgesteld
- ❖ Prijs, onderhoud, garanties, desired state
- ❖ Intensief traject
- ❖ Definitieve keuze: Maart 2018



Nordex en Siemens

Nordex

Tandwielkast

3.9 Mw

120 m mast

131 m rotor

Brongeluid 106 dB

2 plaatjes toevoegen van elke machine

Siemens Gamesa

Direct Drive

4.2 Mw

120 m mast

130 m rotor

Brongeluid 106 dB



Bouwfase

Globale planning

- ❖ Q2-Q3 2018 : Aanleg wegen , fundaties, bekabeling etc.
- ❖ Q1 2019: Opbouw turbines
- ❖ Q1-Q2 2019: Testfase
- ❖ Q2 2019: In bedrijfstelling



Bouwfase

❖ Filmpje Nordex

❖ Vertellen over fibro palen, minder overlast , geen heipalen



Aanvoer en afvoer via noordzijde

❖ Plaatje invoegen



Toplichten

Pilots in Groningen en Zeeland

Doel minder overlast

Wij volgen dit, maar voorlopig moeten we voldoen aan de huidige regelgeving



Obligatieregeling

Wat :

- ❖ Achtergestelde obligatieregeling
- ❖ Na realisatie windpark ivm risico voor deelnemers
- ❖ Uitvoering door professioneel bureau

Voor wie:

- ❖ Voor omwonenden tot 1500 meter
- ❖ Minimum bedrag 500 euro
- ❖ Maximum bedrag 5.000 euro (1^e ronde)
- ❖ Rentepercentage 5 %
- ❖ Totaal bedrag 750.000 euro
- ❖ Eventueel meerdere ronden



Stichting/vereniging

- ❖ Al oprichten of na de bouw?
- ❖ Afspraak was : zodra vergunning er is
- ❖ Bestuur?
- ❖ Taken?



Rondvraag en afsluiting

- ❖ Rondvraag
- ❖ Volgende datum augustus 2018 of eerder ?
- ❖ Hartelijk dank voor uw aanwezigheid
